10



november 2016

# BEHEERPLAN SLOTERPARK

Aanvullingen ontvangen
Datum: 15-03-2017
Kenmerk: OLO 2695239

**Titel:** Beheerplan Sloterpark

**Auteur:** Ronald Buiting
**Datum:** november 2016

**Buiting Advies i.s.m. AKSIS Landschapsarchitecten**

**Contactgegevens:**
Buiting Advies
*Bezoekadres:* Wilhelminaweg 64
6951 BP Dieren
*Telefoon:* 0313 619 042
*Website:* www.buiting.nl

AKSIS Landschapsarchitecten
*Bezoekadres:* Burgemeester Loeffplein 70 /B/C
5211 RX 's-Hertogenbosch
*Telefoon:* 073 612 2729
*Website:* www.aksis-atelier.nl

# INHOUD


1.INLEIDING 4

1.1Sloterpark als belangrijk recreatief stadslandschap 4

1.2Opbouw 4

2.Huidige situatie bosvakken 4

3.Visie op het beheer 5

4.Beheermaatregelen 6

5.Werkplan 6

6.Uitvoering 6

Bijlage 1a: situering bosvakken, hoofdboomsoort en vaknummer oostelijk deel

Bijlage 1b: levensverwachting per bosvak oostelijk deel

Bijlage 1c: set met beheermaatregelen

Bijlage 1d: werkplantabel oostelijk deel

Bijlage 1e: maatregelkaarten oostelijk deel

Bijlage 2: levensverwachting per bosvak westelijk deel

# 1. INLEIDING

## 1.1 SLOTERPARK ALS BELANGRIJK RECREATIEF STADSLANDSCHAP

Het Sloterpark is in beheer bij de gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw-West. Het park ligt tegen de Sloterplas en functioneert als een belangrijk recreatief stadslandschap: binnen het park is op het gebied van recreatie, cultuur en groen veel te doen.

Belangrijk onderdeel van het Sloterpak vormen de bosvakken. Bosvakken zijn vakken die volledig met bomen en struiken zijn begroeid. In het Sloterpark komen 212 bosvakken voor. Bijlage 1 toont de situering van de bosvakken, inclusief hoofdboomsoort en vaknummer.

In de afgelopen decennia is in de bosvakken, los van calamiteitenbeheer, weinig tot geen beheer uitgevoerd. Hierdoor is achterstallig onderhoud ontstaan. Dit uit zich onder andere in de aanwezigheid van lange, dunnen bomen met kleine tot zeer kleine kronen en een matige stabiliteit. Maar ook het voorkomen van bomen met een slechte vitaliteit en dode bomen in veel bosvakken, is een gevolg van het uitblijven van onderhoud.

De gemeente Amsterdam wil het achterstallig onderhoud planmatig wegwerken. Dit beheerplan beschrijft hoe de gemeente dat wil aanpakken.

## 1.2 OPBOUW

Dit beheerplan is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie van de bosvakken van het Sloterpark belicht. Daarbij wordt gebruikgemaakt van onderzoeken die door Bomenwacht Nederland in 2015 en 2016 in opdracht van de gemeente zijn uitgevoerd. Hoofdstuk 3 beschrijft de visie van de gemeente Amsterdam. In deze visie wordt aangegeven welke vier doelen de gemeente met het uitvoeren van planmatig beheer wil realiseren. Vervolgens worden in hoofdstuk 4 de maatregelen gepresenteerd die worden ingezet om de in hoofdstuk 3 geformuleerde doelen binnen de bosvakken te laten landen. In totaal worden 10 maatregelen beschreven. In hoofdstuk 5 wordt het werkplan gepresenteerd. In het werkplan wordt aangegeven welke van de 10 maatregelen uit de set met beheermaatregelen per bosvak zullen worden ingezet. Hoofdstuk 6 gaat in op de uitvoering. Hier wordt de arbeidsfilm van de werkzaamhedengepresenteerd. Ook wordt aangegeven op welke manier de eisen vanuit de Flora- en Faunawet tijdens de uitvoering worden geïmplementeerd. Daarbij is de gedragscode Flora- en faunawet van de gemeente Amsterdam leidend.

# 2. HUIDIGE SITUATIE BOSVAKKEN

Op basis van de wettelijke zorgplicht (NBW 6:162) is gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor de veiligheid van bomen binnen de terreinen die bij de gemeente in eigendom zijn. Om invulling aan de zorgplicht te geven heeft Bomenwacht Nederland in 2015 (oostelijk deel) en 2016 (westelijke deel) in opdracht van de gemeente de huidige situatie in alle groenelementen van het Sloterpark in kaart gebracht. Tijdens die beoordeling is tevens een inschatting van de levensverwachting van de bosvakken gemaakt. Bij de beoordeling van de bosvakken zijn door Bomenwacht drie categorieën gehanteerd:

- bosvak heeft een levensverwachting < 5 jaar;
- bosvak heeft een levensverwachting 5-10 jaar;
- bosvak heeft levensverwachting > 10 jaar.

Tabel 1a toont de resultaten van de kwaliteitsbeoordeling binnen de bosvakken in het oostelijk deel van het Sloterpark, tabel 1b de resultaten van de beoordeling binnen het westelijk deel. Bijlage 1B toont de kaart met daarop de levensverwachting per bosvak binnen het oostelijke deel van het Sloterpark (bron: Bomenwacht Nederland, 2015), bijlage 2 de situatie in het westelijke deel (bron: Bomenwacht Nederland, 2016).

| Levensverwachting | aantal vakken | percentage |
|---|---|---|
| < 5 jaar | 8 | 12% |
| 5 - 10 jaar | 48 | 72% |
| > 10 jaar | 11 | 16% |

*Tabel 1a: levensverwachting en procentuele verdeling bosvakken oostzijde*

| Levensverwachting | aantal vakken | percentage |
|---|---|---|
| < 5 jaar | 10 | 7% |
| 5 - 10 jaar | 94 | 65% |
| > 10 jaar | 41 | 28% |

*Tabel 1b: levensverwachting en procentuele verdeling bosvakken westzijde*

De beoordeling van de bosvakken laat zien dat de situatie zowel in het oostelijk- als het westelijk deel zeer zorgelijk is. In het oostelijk deel is de verwachting dat 84% van de bosvakken over minder dan 10 jaar is uitgevallen, in het westelijk deel gaat om 72%. Dat betekend dat bij ongewijzigd beheer binnen 10 jaar iets meer dan driekwart van al het bos binnen het Sloterpark zal verdwijnen.

De situatie binnen de bosvakken van het Sloterpark is dus zeer kritisch. Daarom is het noodzakelijk op korte termijn over te gaan tot het uitvoeren van planmatig beheer. Belangrijkste opdracht daarbij is het voorkomen van het uitvallen van de bosvakken.

# 3. VISIE OP HET BEHEER

Bij het uitvoeren van planmatig beheer binnen de bosvakken van het Sloterpark richt de gemeente Amsterdam zich op het realiseren van vier belangrijke doelstelling: stabiliteit en veiligheid, aantrekkelijke parkomgeving, klimaatbestendigheid en hoge natuurwaarden. De gemeente ziet de vier doelstellingen als gelijkwaardig.

Stabiliteit en veiligheid binnen alle bosvakken van het Sloterpark is een doel dat de gemeente met het uitvoeren van planmatig beheer wil bereiken. Dit doel is gezien de uitkomsten van het onderzoek van Bomenwacht Nederland (zie hoofdstuk 2) bijzonder urgent. De gemeente wil dit doel bereiken door stabiele bomen meer ruimte te geven en dode en niet vitale bomen te verwijderen.

Daarnaast wil de gemeente binnen de ontwikkeling van het Sloterpark een aantrekkelijke parkomgeving realiseren. Dat betekent dat bosvakken zijn opgebouwd uit mooie, individuele, gezonde bomen met grote kronen. Om voor voldoende afwisseling te zorgen komen per bosvak verschillende boomsoorten voor. Extra aandacht gaat uit naar de bosranden. In een deel van de bosvakken wil de gemeente het unieke 'bosrandbeeld' in stand houden. Dit geldt bijvoorbeeld voor de eilanden en bosvakken die direct aan de plas grenzen.

De gemeente wil ook dat de bosvakken van het Sloterpark klimaatbestendig worden. Dat kan door een keuze te maken voor een specifieke mix van boom- en struiksoorten, passend bij de hoogteligging en ontwateringstoestand van elk bosvak. Op de hogere en drogere delen streeft de gemeente naar het ontwikkelen van bosvakken begroeid met zomereik en haagbeuk, met in de struiklaag en mantelvegetatie meidoorn, sleedoorn, kornoelje, Gelderse roos en hazelaar. In de lagere en meer natte delen is de boomlaag begroeid met schietwilg en zwarte els, met in de struiklaag en mantelsverschillende struikwilgen (kraakwilg, geoorde wilg, katwilg, etc.). Door deze inrichting zullen de bosvakken ook bij neerslagpieken binnen het groeiseizoen vitaal blijven.

Tenslotte wil de gemeente via beheerinterventies de natuurkwaliteit binnen de bosvakken verder verhogen. Dit kan bijvoorbeeld door de bosstructuur te verbeteren, maar ook door het realiseren van mantel- en zoomvegetaties.

Het uitvoeren van gerichte en samenhangende beheermaatregelen moet er dus toe leiden dat de bosvakken van het Sloterpark zich ontwikkeling tot stabiele, veilige en klimaatbestendige bossen, met bijzondere esthetische kwaliteiten en hoge natuurwaarde.

# 4. BEHEERMAATREGELEN

Om de door de gemeente Amsterdam benoemde doelen in de praktijk te realiseren is een set met beheermaatregelen ontwikkeld. De maatregelenset beschrijft de beheerinterventies die kunnen worden ingezet om de bosontwikkeling in de bosvakken te sturen. In totaal zijn 10 maatregelen geformuleerd:

1. dunning uitvoeren
2. bomen in de rand stabiliseren
3. bomen groepsgewijs vrijstellen
4. bosstructuur verbeteren
5. bosrand ontwikkelen
6. struiketage verwijderen
7. tak- en tophout opruimen
8. laan vrijstellen
9. bosvak uitdoven
10. kaalkap uitvoeren

De totale set met beheermaatregelen wordt in bijlage 1c gepresenteerd. Per maatregel worden telkens zowel het doel als de manier waarop de maatregel in de praktijk moet worden toegepast beschreven.

# 5. WERKPLAN

Het werkplan is opgesteld gericht op het uitvoeren van de Tijdens het opstellen van het werkplan voor het Sloterpark is in het veld per bosvak bepaald welke maatregelen uit de set met beheermaatregelen[1] moeten worden ingezet om het gewenste beeld te realiseren. Hierdoor wordt duidelijk welk beheer in een specifiek bosvak moet worden uitgevoerd. In bijlage 1d wordt het uit te voeren beheer per bosvak in het oostelijke deel gepresenteerd. Bijlage 1e toont de maatregelkaarten van het oostelijke deel met daarop de locatie(s) van de uit te voeren beheermaatregelen.

# 6. UITVOERING

Gezien de situatie binnen de bosvakken is het van groot belang de beheermaatregelen zo snel mogelijk uit te voeren. Daarbij wordt de volgende arbeidsfilm aangehouden.

- De gemeente ontwikkeld een bestek met daarin een goede werkomschrijving en randvoorwaarden.
- De gemeente kiest de aannemer die het werk maagd uitvoeren op basis van de gunningscriteria.
- De blesser wordt extern -los van de aannemer- door de gemeente ingehuurd. Hierdoor wordt gegarandeerd dat het bleswerk conform de set met beheermaatregelen wordt uitgevoerd.
- De blesser zet de noodzakelijke beheermaatregelen voorafgaand aan de uitvoering per bosvak in het veld uit met behulp van markeerverf, conform de maatregelbeschrijving (zie bijlage 1c) en het werkplan (zie bijlage 1d). Daarbij wordt het aantal gebleste bomen geteld.
- De blesser voert tijdens het uitzetten van het bleswerk een controle uit gericht op de aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten, nestlocaties en andere vaste verblijfplaatsen. Indien beschermde plant- en diersoorten, nestlocaties en andere vaste verblijfplaatsen aanwezig zijn worden die door de blesser in het veld gemarkeerd.

[1] *In een deel van de bosvakken is het noodzakelijk meer dan één maatregel toe te passen om de gewenste situatie te bereiken.*

- De blesser meet alle gemarkeerde bomen op stam en deelt ze in naar diameterklasse. Ook worden de flora- en faunagegevens op kaart ingetekend.
- De aannemer ontvangt het overzicht van het aantal gebleste bomen en de verdeling over de diameterklassen.Tevens worden de kaarten met daarop de locaties van beschermde plant- en diersoorten, nestlocaties en andere vaste verblijfplaatsen ter beschikking gesteld.

De aannemer ontwikkelt een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe tijdens de uitvoering van de werkzaamhedenwordt gehandeld conform de uitgangspunten van de gedragscode Flora- en faunawet van de gemeenteAmsterdam.
De aannemer verwijdert de gemarkeerde bomen.Ook het tak- en tophout wordt door de aannemer afgevoerd. Bij het uitvoeren van de velwerkzaamheden mogen bomen binnen de blijvende opstand niet worden beschadigd.
De gemeenteAmsterdam controleert of de werkzaamheden conform afspraak zijn uitgevoerd.

# BIJLAGE 1A: SITUERING BOSVAKKEN, HOOFDBOOMSOORT EN VAKNUMMER OOSTELIJK DEEL




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## BOOMSOORTENSAMENSTELLING

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | Definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 8-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**Sloterparkwerkplan bossen**

**Hoofdboomsoort**

- berk
- es
- iep
- wilg
- zomereik
- Overige

aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl

SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - BOOMSOORTEN SAMENSTELING

# BIJLAGE 1B: LEVENSVERWACHTING PER BOSVAK OOSTELIJK DEEL

(BRON: BOMENWACHT NEDERLAND, 2015)

# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## LEVENSVERWACHTING PER BOSVAK

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**Beoordeling levensverwachting**

Bron: Bomenwacht 2015

- < 5 jaar
- 5 - 10 jaar
- > 10 jaar

0 62,5 125 250 m

CycloMedia, Aerodata, Geocart, Esri Nederland


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - LEVENSVERWACHTING PER BOSVAK

# BIJLAGE 1C: SET MET BEHEERMAATREGELEN

## MAATREGEL 1: DUNNING UITVOEREN

Doel

Doel van maatregel 1 is het vergroten van de stabiliteit van de beplanting door het creëren van ruimte in het kronendak. Deze ruimte komt als groeiruimte ter beschikking van bomen die vanwege hun betekenis voor natuur- of belevingswaarde bestemd zijn om een lange tijd een rol in een bosvak te spelen. Door het aanbieden van ruimte zullen deze bomen hun kronen uitbreiden en hun stam verder verdikken.

Uitvoering

In een bosvak worden de bomen of boomgroepen opgezocht die behouden moeten worden. Vervolgens worden één of meer bomen die de individuele boom of boomgroep in het kronendak hinderen met verf gemarkeerd. De gemarkeerde bomen worden verwijderd. Hierdoor krijgen de blijvende boom of boomgroep meer ruimte en kunnen de kronen zich verder uitbreiden. Al het vrijkomende stam-,tak- en tophout wordt afgevoerd. Bij het uitzetten van de dunning moet de stabiliteit van de bomen in het bosvak altijd worden meegewogen. Bij een matige stabiliteit wordt lichter ingegrepen.

## MAATREGEL 2: BOMEN IN RAND STABILISEREN

Doel

Doel van maatregel 2 is het verhogen van de stabiliteit van randbomen. Alleen boomvakken langs de Sloterplas, met diepe kronen tot aan het waterspiegel, komen voor deze maatregel in aanmerking. Het behouden van de randbomen is vanuit visueel oogpunt -ook vanuit de oevers aan de overkant van de plas- belangrijk.

Uitvoering

Bomen langs de waterkant worden gestabiliseerd door concurrerende bomen aan de binnenzijde van de opstand weg te nemen. Hierdoor kunnen de -vaak zeer kleine- kronen van de randbomen zich ook aan de niet-waterzijde ontwikkelen. Door deze ontwikkeling ontstaan boomvormen met meerevenwicht. Belangrijk is dat het randbeeld aan de plaskant altijd wordt gehandhaafd. Al het vrijkomende stam-,tak- en tophout wordt afgevoerd.

## MAATREGEL 3: BOMEN GROEPSGEWIJS VRIJSTELLEN

Doel

Doel van maatregel 3 is het binnen een bosvak vrijzetten van mooie individuele bomen of mooie boomgroepen (2 tot 4 exemplaren). Door het uitvoeren van maatregel 3 transformeert een bosvak naar een boomweide met individuele bomen en boomgroepen.

Uitvoering

Maatregel 3 start met het in een boomvlak met linten markeren van de te behouden individuele bomen en boomgroepen. Vervolgens worden alle andere bomen met verf gemarkeerd. De gemarkeerde bomen worden geveld en afgevoerd. Ook het tak- en tophout wordt afgevoerd. De overgebleven stobben worden gefreesd.

Bij het uitvoeren van maatregel 3 is het van groot belang de stabiliteit van de vrij te zetten individuele bomen en boomgroepen te beoordelen. In situaties waarin de individuele bomen of boomgroepen niet voldoende stabiliteit hebben kan het noodzakelijk zijn de transformatie van bosvak naar boomweide in twee stappen uit te voeren.

## MAATREGEL 4: BOSSTRUCTUUR VERBETEREN

Doel

Doel van maatregel 4 is het verhogen van de structuurvariatie binnen een bosvak. In een bosvak is geen structuurvariatie aanwezig wanneer over de hele oppervlakte een gesloten kronendak of struiklaag aanwezig is. De structuur van een boomvak kan worden verbeterd door het kronendak groepsgewijs te

lichten. Bij groepsgewijs lichten worden de bomen in het kronendak kleinschalig groepsgewijs verwijderd. Daardoor krijgt de ondergroei op die locaties meer licht, waardoor verjonging harder door kan groeien. Hierdoor ontstaat differentiatie in het kronendak en struiketage en wordt het homogene bosbeeld doorbroken.

Uitvoering
In het kronendak worden groepsgewijs bomen verwijderd ('groepsgewijs lichten'). De te verwijderen bomen worden met verf gemarkeerd. Al het stam-, tak- en tophout wordt afgevoerd. Ook kunnen binnen deze maatregel de reeds in het kronendak aanwezige gaten verder worden uitgebreid.

## MAATREGEL 5: BOSRAND ONTWIKKELEN

Doel
Maatregel 5 heeft tot doel een harde bosrand, die enkel en alleen uit boomvormers bestaat, om te vormen tot natuurlijke mantel- en zoomvegetatie.

Uitvoering
Op een brede strook wordt de kroonsluiting verlaagd tot een bedekking van maximaal 10% (= hier en daar een markante boom of boomgroep handhaven). Al het stam-, tak- en tophout wordt afgevoerd. Vervolgens wordt de vrijgekomen open ruimte ingeplant met struiken. De aanplant wordt groepsgewijs gemengd geplant in een wild heterogeen plantverband. De soortkeuze is afhankelijk van het ontwerp.

## MAATREGEL 6: STRUIKETAGE VERWIJDEREN

Doel
Maatregel 6 heeft tot doel alle struiken binnen een bosvak te verwijderen.

Uitvoering
Alle struiken in een bosvak worden met verf markeren en systematisch verwijderd. Alle struiken worden afgevoerd. Hierdoor ontstaat een open, transparant bosbeeld.

## MAATREGEL 7: TAK- EN TOPHOUT OPRUIMEN

Doel
Maatregel 7 heeft tot doel het stadsparkkarakter te versterken door het opruimen van takken en stamdelen van gevelde en omgewaaide bomen. Ook grote wortelkluiten of hoge stobben worden verwijderd of gefreesd. Al het materiaal wordt afgevoerd, zodat een verzorgd beeld ontstaat.

Uitvoering
Takken en stamdelen worden in het veld in verwerkbare stukken gezaagd, opgeladen en afgevoerd. Het meeste materiaal kan ook op locatie worden gechipt, afgevoerd en ingezet als grondstof voor bijvoorbeeld energieopwekking.

## MAATREGEL 8: LAAN VRIJSTELLEN

Doel
Doel van maatregel 8 is het organiseren van voldoende groeiruimte voor de langs een bosvak gelegen laanbeplanting van de Johan Huizingalaan.

Uitvoering
Een laan langs een bosvak wordt ruim vrijgesteld door concurrerende bomen in het aangrenzende bosvak te verwijderen. Dit gebeurt strooksgewijs. Al het vrijkomende stam-, tak- en tophout wordt afgevoerd. Binnen de opengevallen ruimte wordt een mantelvegetatie ontwikkeld (zie M5).

## MAATREGEL 9: BOSVAK UITDOVEN

Doel

Doel van maatregel 9 is het langzaam, langs natuurlijke weg, transformeren van een bosvak richting een korte vegetatie. Het uiteindelijke doel is een open zone zonder bomen, maar met kruiden.

Uitvoering

Jaarlijks worden in een bosvak bomen met een levensverwachting <5 jaar verwijderd. De te verwijderen bomen worden met verf gemarkeerd. Al het vrijkomende stam-, tak- en tophout wordt afgevoerd. De stobben worden gefreesd en er wordt niet ingeboet.

## MAATREGEL 10: KAALKAP UITVOEREN

Doel

Maatregel 10 heeft tot doel een bosvak dat dusdanig slecht is dat echt niet meer te redden is, in één keer om te vormen naar een nieuwe situatie. De uiteindelijke te realiseren nieuwe invulling is afhankelijk van het parkontwerp.

Uitvoering

Alle bomen en struiken worden met verf gemarkeerd en geveld. Al het vrijkomende stam-, tak- en tophout wordt afgevoerd. Alle stobben worden gefreesd.

# BIJLAGE 1D: WERKPLANTABEL OOSTELIJK DEEL

## SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN

| Afdeling | Oppervlakte(hectare) | Opmerking | Boomsoort1 | Boomsoort1 diameter | Boomsoort1 percentage | Boomsoort2 | Boomsoort2 diameter | Boomsoort2 percentage | Struiksoort1 | Struiksoort1 percentage | Struiksoort2 | Struiksoort2percentage | M1 Hoogdunning | M2 Bomen in randstabiliseren | M3 Bomengroepsgewijs vrijzetten | M4 Bosstructuur verbeteren | M5 Bosrand ontwikkelen | M6 Struiketage verwijderen | M7 Tak en tophout opruimen | M8 Laan vrijstellen | M9 Bosvak uitdoven | M10 Kaalkappen | Afdeling |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,23 | gedeeltelijk verjongd | Ulmus spec. | 45 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | 1 |
| 2 | 0,54 | zware populier in de rand | Quercus robur | 40 | 90 | Acer campestre | 30 | 20 | Sambucus nigra | 20 | | | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | 2 |
| 3 | 0,45 | zuidelijke deel berk, enkele es met taksterfte | Quercus robur | 35 | 50 | Betula pendula | 40 | 50 | Sambucus nigra | 10 | | | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | 3 |
| 4 | 0,07 | zuidelijke deel berk, enkele es met taksterfte | Quercus robur | 35 | 50 | Betula pendula | 40 | 50 | Sambucus nigra | 10 | | | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 4 |
| 5 | 0,55 | Inlandse vogelkers, gedeeltelijk kaakappen | Quercus robur | 45 | 90 | Carpinus betulus | 35 | 10 | Sambucus nigra | 20 | | | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | 5 |
| 6 | 0,04 | | Ulmus spec. | 45 | 100 | | 50 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 6 |
| 7 | 1,02 | ook schietwilg | Ulmus spec. | 45 | 30 | Quercus robur | 70 | 50 | Sambucus nigra | 20 | Crataegus monogyna | 10 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | 7 |
| 8 | 0,71 | taksterfte aanwezig, ook populier | Fraxinus excelsior | 40 | 40 | Wilg | 50 | 20 | Crataegus monogyna | 20 | Sambucus nigra | 20 | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 8 |
| 9 | 0,35 | doorzicht langs eiland herstellen | Ulmus spec. | 45 | 100 | | 45 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 9 |
| 10 | 0,34 | | Ulmus spec. | 30 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 10 |
| 11 | 0,26 | | Ulmus spec. | 30 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 11 |
| 12 | 0,07 | | Ulmus spec. | 30 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 12 |
| 13 | 0,25 | inlandse vogelkers in ondergroei | Quercus robur | 35 | 70 | Betula pendula | 30 | 30 | Sambucus nigra | 20 | Euonimus europaeus | 10 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 13 |
| 14 | 0,08 | inlandse vogelkers in ondergroei | Betula pendula | 35 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 20 | Euonimus europaeus | 10 | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 14 |
| 15 | 0,25 | | Quercus robur | 45 | 50 | Ulmus spec. | 45 | 50 | Sambucus nigra | 50 | | | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | 15 |
| 16 | 0,18 | | Quercus robur | 45 | 50 | Ulmus spec. | 45 | 50 | Sambucus nigra | 50 | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 16 |
| 17 | 0,35 | | Ulmus spec. | 45 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 50 | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 17 |
| 18 | 0,63 | bedekking 30% | Wilg | 60 | 30 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 18 |
| 19 | 0,28 | slechte vitaliteit | Ulmus spec. | 55 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 19 |
| 20 | 0,04 | | Ulmus spec. | 45 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 50 | | | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 20 |
| 21 | 0,05 | | Quercus robur | 45 | 30 | | 0 | | Sambucus nigra | 50 | | | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 21 |
| 22 | 0,01 | | Betula pendula | 30 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 50 | | | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 22 |
| 23 | 0,35 | slechte hoogte- diameter verhouding | Quercus robur | 30 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 60 | | | Ja | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 23 |
| 24 | 0,84 | brede mantel, diverse soorten slechte vitaliteit | Quercus robur | 30 | 50 | Betula pendula | 20 | 5 | Sambucus nigra | 60 | | | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 24 |
| 25 | 0,07 | brede mantel, diverse soorten slechte vitaliteit | Quercus robur | 30 | 50 | Betula pendula | 20 | 5 | Sambucus nigra | 60 | | | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 25 |
| 26 | 0,13 | brede mantel, diverse soorten slechte vitaliteit | Quercus robur | 30 | 50 | Betula pendula | 20 | 5 | Sambucus nigra | 60 | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 26 |
| 27 | 0,07 | | Ulmus spec. | 50 | 20 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 27 |
| 28 | 0,31 | | Ulmus spec. | 60 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 28 |
| 29 | 0,11 | | Ulmus spec. | 25 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 29 |
| 30 | 1,28 | slechte hoogte- diameter verhouding en vitaliteit | Quercus robur | 25 | 95 | Carpinus betulus | 25 | 5 | Sambucus nigra | 40 | | | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 30 |
| 31 | 0,19 | slechte hoogte- diameter verhouding en vitaliteit | Quercus robur | 25 | 95 | Carpinus betulus | 25 | 5 | Sambucus nigra | 40 | | | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 31 |
| 32 | 0,03 | | Betula pendula | 25 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 40 | | | Ja | Nee | Nee | Ja | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 32 |
| 33 | 0,06 | | Ulmus spec. | 40 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | 33 |
| 34 | 0,18 | net ingeplant met verkeerde soorten | Overige zie opmerking; | 0 | | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | 34 |
| 35 | 0,11 | | Ulmus spec. | 65 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 20 | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 35 |
| 36 | 0,10 | | Betula pendula | 25 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 36 |
| 37 | 0,26 | open boomweide vleugel noot | Overige zie opmerking; | 0 | | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 37 |
| 38 | 0,08 | | Ulmus spec. | 25 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 38 |
| 39 | 0,25 | | Ulmus spec. | 30 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 39 |
| 40 | 0,65 | ook grote veldesdoorn | Quercus robur | 40 | 90 | Carpinus betulus | 35 | 10 | Sambucus nigra | 20 | | | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 40 |
| 41 | 0,48 | natte groeiplaats, veel grote veldesdoorn | Quercus robur | 30 | 90 | Alnus glutinosa | 30 | 10 | Sambucus nigra | 20 | | | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 41 |
| 42 | 0,45 | | Ulmus spec. | 35 | 100 | | 0 | | | | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 42 |
| 43 | 0,55 | struweel met kruiden, individuele bomen iep | Overige zie opmerking; | 0 | | | 0 | | | | | | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 43 |
| 44 | 0,57 | veldesdoorn en zeer zware populier 100cm | Overige zie opmerking; | 100 | 50 | Acer campestre | 35 | 50 | Sambucus nigra | 30 | Crataegus monogyna | 20 | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | 44 |
| 45 | 0,28 | staande dode wilg direct aan pad | Ulmus spec. | 45 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 80 | | | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 45 |
| 46 | 0,30 | zware bomen ook plakoksels | Ulmus spec. | 60 | 100 | | 0 | | Sambucus nigra | 80 | | | Nee | Ja | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | Nee | 46 |
| | 14,44 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# BIJLAGE 1E: MAATREGELKAARTEN OOSTELIJK DEEL

# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M1 HOOGDUNNING

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**Maatregel 1 hoogdunning**

- Ja
- Nee


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M1 HOOGDUNNING

0 62,5 125 250 m

CycloMedia, Aerodata, Geocart, Esri Nederland




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M2 BOMEN IN RAND STABILISEREN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M2 Bomen in rand stabiliseren**

- Ja
- Nee

aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl

SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M2 BOMEN IN RAND STABILISEREN




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M3 BOMENGROEPSGEWIJS VRIJZETTEN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M3 Groepsgewijs vrijzetten**

- Ja
- Nee


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M3 BOMENGROEPSGEWIJS VRIJZETTEN

# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M4 BOSSTRUCTUUR VERBETEREN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M4 Bosstructuur verbeteren**

- Ja
- Nee


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


0 62,5 125 250 m

CycloMedia, Aerodata, Geocart, Esri Nederland

SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M4 BOSSTRUCTUUR VERBETEREN




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M5 BOSRAND ONTWIKKELEN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M5 Bosrand ontwikkelen**

- Ja
- Nee

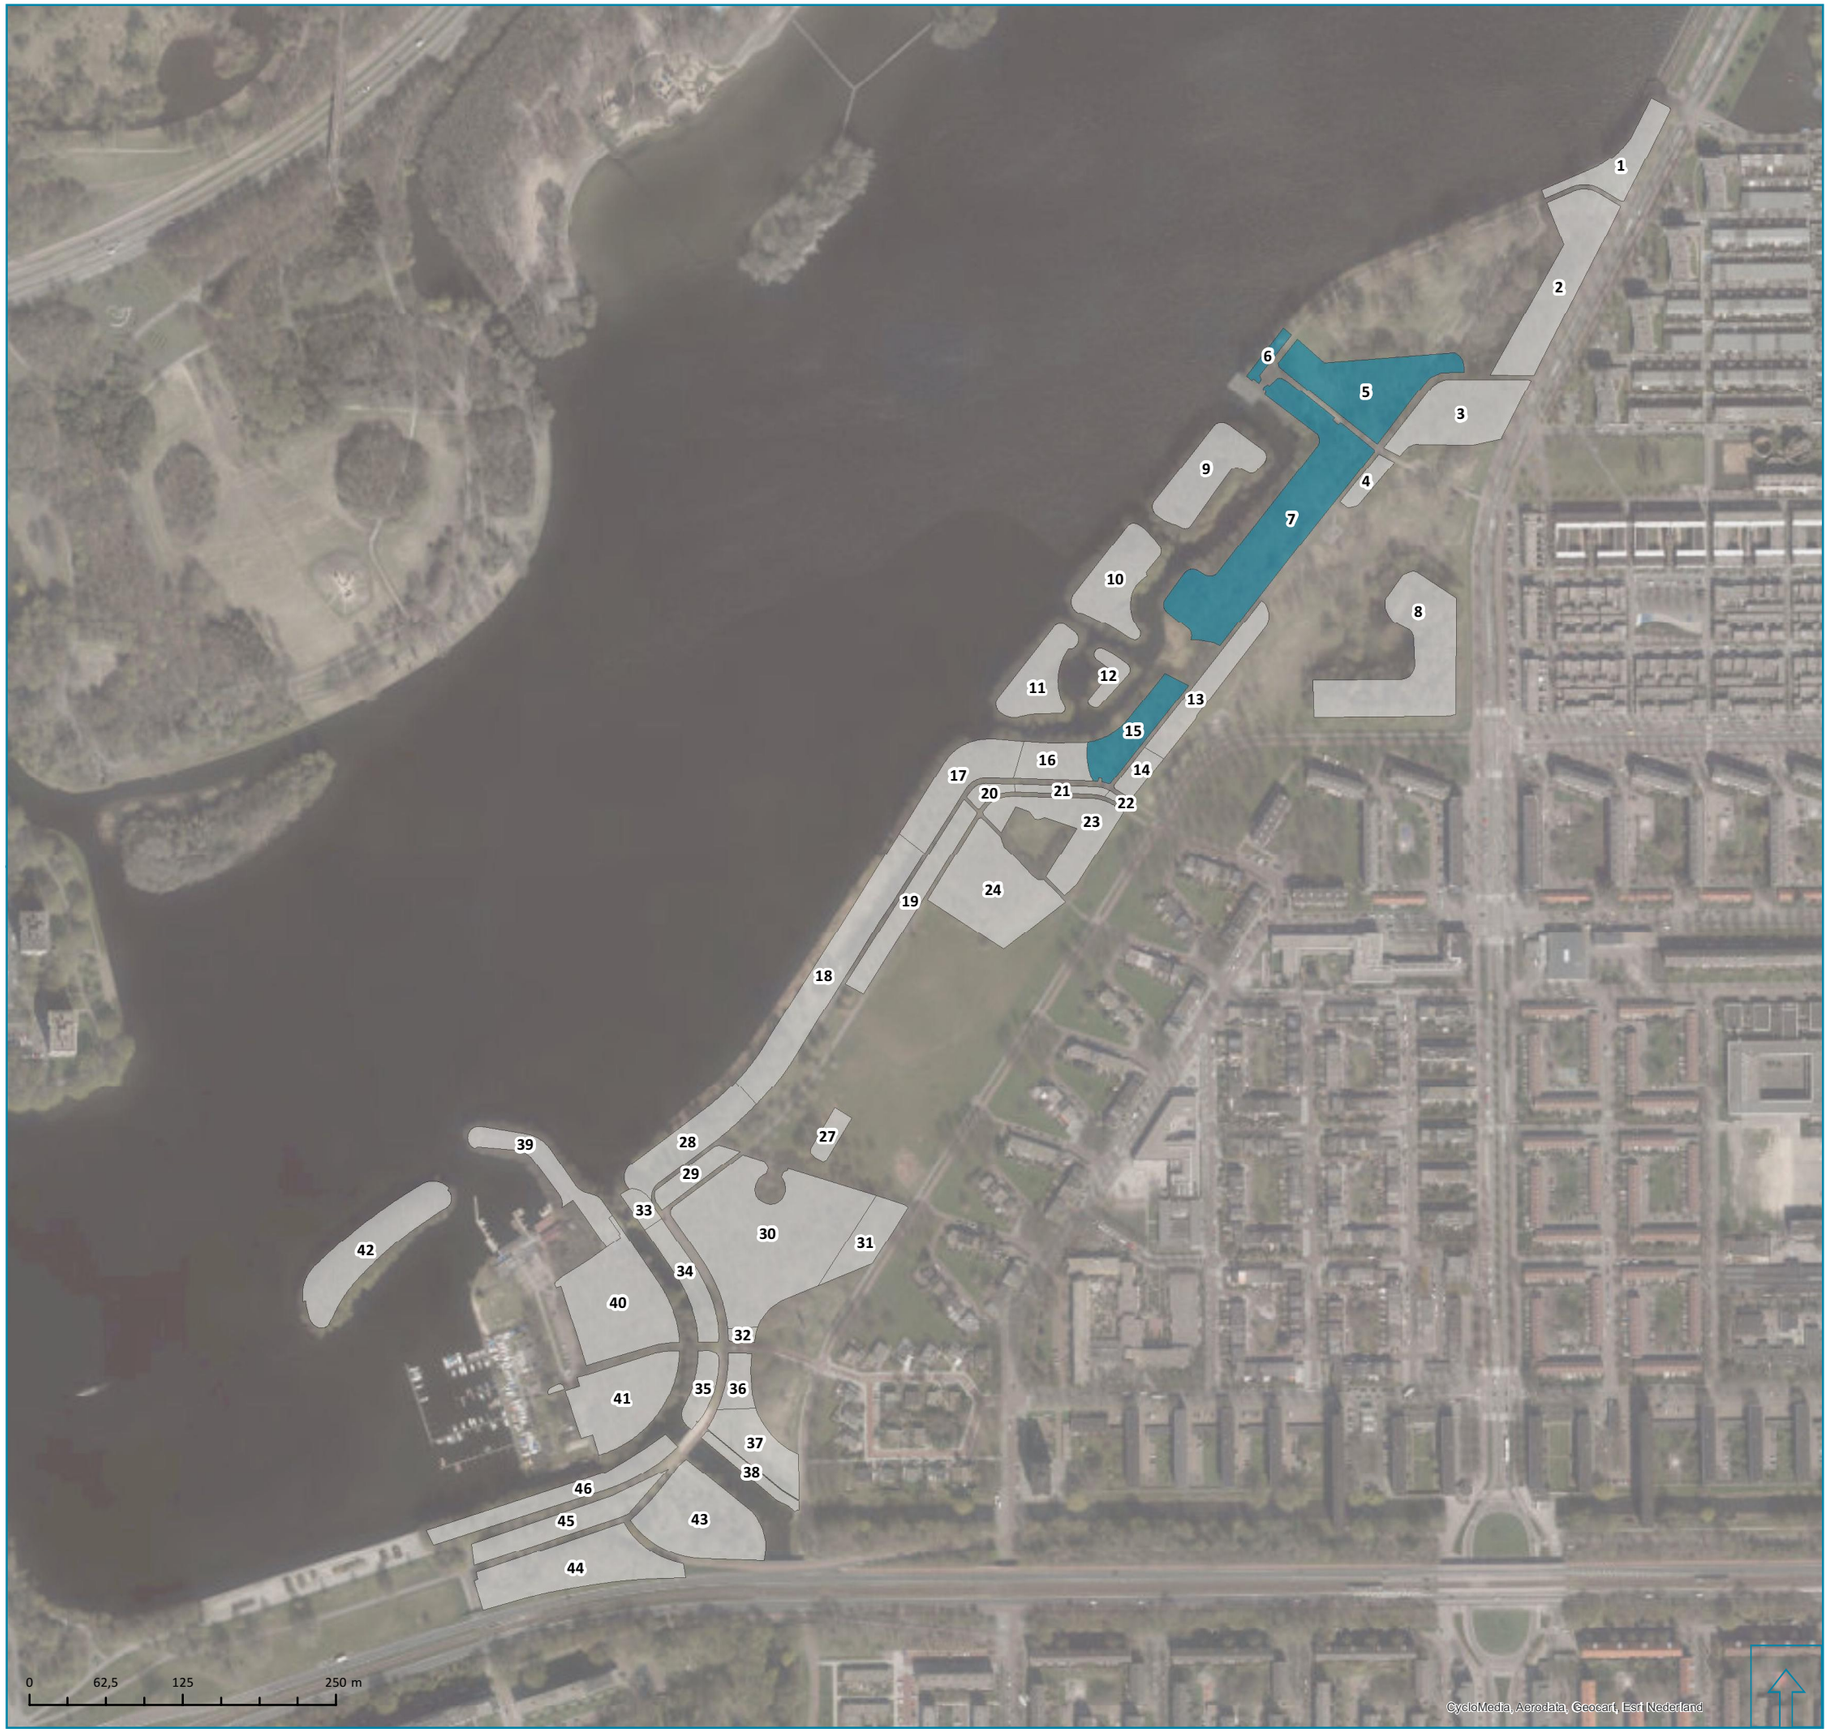

aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M5 BOSRAND ONTWIKKELEN




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M6 STRUIKETAGE VERWIJDEREN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M6 Struiketage verwijderen**

- Ja
- Nee

aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl

SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M6 STRUIKETAGE VERWIJDEREN




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M7 TAK EN TOPHOUT OPRUIMEN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M7 tak en tophout opruimen**

- Ja
- Nee


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M7 TAK EN TOPHOUT OPRUIMEN




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M8 LAAN VRIJSTELLEN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | definitief |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M8 Laan vrijstellen**

- Ja
- Nee

aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl

SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M8 LAAN VRIJSTELLEN




# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M9 BOSVAK UITDOVEN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| status: | concept |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 27-6-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M9 Bosvak uitdoven**

- Ja
- Nee


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M9 BOSVAK UITDOVEN

# SLOTERPARK - WP BOSSEN

## M10&11 KAALKAPPEN EN PLANTEN

| | |
|---|---|
| opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| contactpersoon: | Caroline Elbers-Hugenholtz<br>Senior adviseur groene en ruimtelijke ontwikkelingen parken |
| schaal: | 1:5.000 |
| datum opmaak: | 4-11-2016 |
| formaat: | A3 landscape |
| tekenaar: | TL |
| projectnummer: | 16020 |

## LEGENDA

**M10 Kaalkappen1,98 hectare**

- Ja
- Nee

**M11 Planten - 1,92 hectare**

- Planten


aksis

Aksis landschapsarchitecten
Adres: Burgemeester Loeffplein 70 B|C
Postcode: 5211 RX 's Hertogenbosch, Nederland
Telefoon: +31(0)736122729
E-mail: postbus@aksis-atelier.nl
Website: www.aksis-atelier.nl

BUITING ADVIES NATUUR LANDSCHAP

Buiting Advies
Bezoekadres: Wilhelminaweg 64 Dieren, Nederland
Postadres: Postbus 98 6950 AB Dieren
Telefoon: +31(0)313 619042
E-mail: advies@buiting.nl
Website: www.buiting.nl


SLOTERPARK WERKPLAN BOSSEN - M10 & M11 KAALKAPPEN EN PLANTEN

0 62,5 125 250 m

CyclaMedia, Aerodata, Geocart, Esri Nederland

# BIJLAGE 2: LEVENSVERWACHTING PER BOSVAK WESTELIJK DEEL

(BRON: BOMENWACHT NEDERLAND, 2016)

## Legenda

Werkgrens

Kwaliteitscategorie bomen
- Overige bomen
- Voldoende
- Matig
- Onvoldoende
- Niet aanwezig
- Niet te beoordelen

GBK_TOPO

Kwaliteitscategorie bosplantsoenvakken
- Voldoende
- Matig
- Onvoldoende

**Sloterpark Noord, West en Zuid** 01/01

Kwaliteit bomen en bosplantsoenvakken

| | |
|---|---|
| Opdrachtgever: | Gemeente Amsterdam |
| Projectcode: | 16183 |
| Schaal: | 1:2500 |
| Papierformaat: | A0 |
| Status: | Definitief |
| Datum: | 23 juni 2016 |

**Bomenwacht Nederland B.V.**
Postbus 240
2900 AE Capelle aan den Ussel
T (010) 264 65 55
I www.bomenwacht.nl

Bomenwacht NEDERLAND

Buiting Advies
Wilhelminaweg 64
6951 BP Dieren

0313 - 619042
www.buiting.nl
